


Sprawozdanie z monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 za okres do 2023 roku

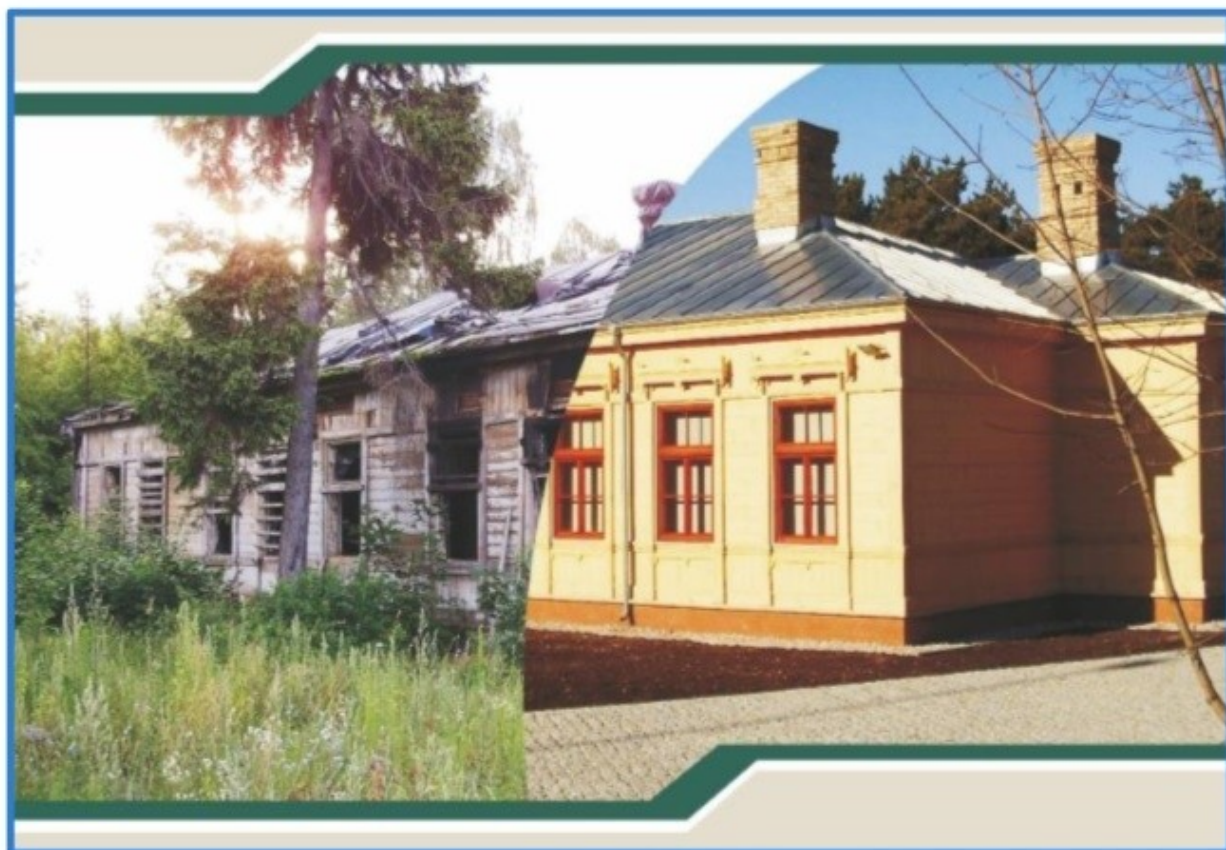

Legionowo, styczeń 2025 r.

Spis treści

1. Wstęp.....	3
2. Bieżąca kontrola prowadzona przez Zespół ds. Rewitalizacji.....	4
3. Prowadzone projekty rewitalizacyjne.....	5
4. Monitoring rzeczowy.....	13
4.1. Wskaźniki produktu i rezultatu dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych.....	13
4.2. Wskaźniki obszaru rewitalizacji.....	19
5. Monitoring finansowy.....	22
6. Monitoring ryzyk.....	26
6.1 Postępujące „starzenie się” społeczeństwa.....	26
6.2 Dostępność środków z UE.....	27
7. Ocena końcowa.....	28



Sprawozdanie opracowane przez Referat Strategii i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta Legionowo

1. Wstęp

Monitoring stanowi jeden z kluczowych elementów procesu zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023. Monitorowanie wdrażania zapisów *Programu* oraz kontrolowanie sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej obszaru rewitalizacji pozwala na reagowanie na zachodzące zmiany i weryfikację skuteczności prowadzonych działań. Zgodnie z zapisami *Lokalnego Programu Rewitalizacji* kolejnym rokiem objętym monitoringiem jest rok 2023. Prezentowane w niniejszym sprawozdaniu wskaźniki obszaru rewitalizacji odnoszą się do roku 2023 lub okresu 01.01.2022 r. - 31.12.2023 r. (jeżeli nie jest zaznaczone inaczej). Wskaźniki dla projektów liczone są od początku wdrażania LPR do końca 2023 r.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Legionowo Nr XXX/391/2017 26 kwietnia 2017 r., a następnie zmieniony uchwałami Nr XXXII/419/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz Nr XLVI/631/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Wyznaczony w dokumencie obszar rewitalizacji obejmuje 270,11 ha (19,95% powierzchni miasta) i był zamieszkały przez 13 676 Legionowian – 26% ludności miasta (dane z 2017 r.), w 2023 r. przez 12 835 – 26% ludności miasta (stan na 31.12.2023 r.).

Obszar rewitalizacji podzielony został na osiem podobszarów:

- I. Os. Młodych,
- II. Grudzie,
- III. III Parcela (II),
- IV. Bukowiec A – os. komunalne,
- V. Centrum,
- VI. Jagiellońska (IV),
- VII. Przystanek (II),
- VIII. Kozłówka.

2. Bieżąca kontrola prowadzona przez Zespół ds. Rewitalizacji

Zespół ds. Rewitalizacji pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą w stosunku do Prezydenta Miasta w zakresie rewitalizacji, w szczególności odnośnie do procesów monitorowania, wdrażania oraz aktualizowania *Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023*.

Zespół prowadzi działalność na podstawie *Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023* oraz Zarządzeń Prezydenta Miasta Legionowo ustalających jego regulaminy.

W skład Zespołu wchodziło: dwaj przedstawiciele Rady Miasta Legionowo, czterej przedstawiciele Urzędu Miasta Legionowo/jednostek organizacyjnych gminy/spółek z udziałem gminy wyznaczeni przez Prezydenta Miasta Legionowo oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Legionowa, przedstawicieli przedsiębiorców działających na terenie Legionowa, dwaj mieszkańcy Legionowa wybrani w drodze otwartego naboru.

Zgodnie z zapisami *Programu* Zespół raz na pół roku wydawał opinie nt. postępu procesu rewitalizacji oraz aktualności *Programu*. Opinie nt. postępu procesu rewitalizacji wydane zostały 08.02.2022 r., 12.10.2022 r., 31.03.2023 r., 26.09.2023 r., 06.02.2024 r. - wszystkie pozytywne. Opinie nt. aktualności *Programu* wydane zostały 08.02.2022 r., 12.10.2022 r., 31.03.2023 r., 26.09.2023 r., - wszystkie pozytywne.

Dnia 18.11.2022 r. Zespół wydał pozytywną opinię w sprawie „Sprawozdania z monitoringu *Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023* - za okres do 2021 r.”.

Łącznie przez okres swojej działalności Zespół ds. Rewitalizacji wydał 49 opinii.

3. Prowadzone projekty rewitalizacyjne

W okresie ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji realizowane były następujące projekty rewitalizacyjne:

Podstawowe:

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 26.04.2017-31.12.2023
1.	P.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla Kozłówka i osiedla Młodych	2018-2021	We wcześniejszym okresie legionowski OPS realizował projekt pn. „Silna Rodzina – samodzielność, niezależność, aktywność” (635 tys. zł dofinansowania w ramach działania 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu RPO WM 2014-2020, wartość całkowita 830 tys. zł). Projekt zakłada zmniejszenie wielokrotnego wykluczenia społecznego i ubóstwa 80 rodzin z dziećmi z Legionowa (wielodzietnych, ubogich, z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, niepełnosprawnością, długotrwałym bezrobociem, niezaradnością w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, w tym samotnych rodziców), w tym rodzin z obszaru rewitalizacji.
2.	P.2. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych	2017-2023	W czerwcu 2018 r. zakończona została realizacja projektu pn. „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną do zrównoważonego rozwoju kadry na legionowskim rynku pracy” o wartości 609 tys. zł (uzyskane dofinansowanie z EFS UE i budżetu państwa to 546 tys. zł). Projektem objętych było 240 uczniów z 7 szkół (w większości z terenu Legionowa). W latach 2020-2021 realizowany był projekt pn. „Dobry start dla

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 26.04.2017-31.12.2023
			każdego przedszkolaka w Legionowie” otrzymał dofinansowanie w ramach działania 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPO WM 2014-2020. Projekt skierowany był do 270 dzieci, a jego głównym celem było wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 2021 r. realizowany był projekt w ramach programu „Aktywna tablica” o wartości 10 719,96 zł (dofinansowanie: 8 069,49 zł). Zadanie obejmowało zakup pomocy dydaktycznych: interaktywnego monitora dotykowego (do projekcji filmów i przedstawiania prezentacji) oraz głośników (do nauki języków nowożytnych).
3.	P.3. Wspieranie kompetencji wychowawczych oraz propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców III Parceli	2018-2021	We wcześniejszym okresie w ramach inicjatywy lokalnej zrealizowany został projekt pn. „Utworzenie muzycznego placu zabaw na III Parceli, na terenie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Targowej”.
4.	P.4a. Centrum Profilaktyki – termomodernizacja i remont	2018-2021	Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna RPO WM 2014-2020 (wniosek złożony w 2020 r., informacja o dofinansowaniu – 2022 r.). Wartość całkowita projektu to 3 798 161,06 zł, dofinansowanie z UE – 1 769 008,11 zł. Projekt obejmuje łącznie 4 budynki. Szacunkowa wartość prac budynku centrum profilaktyki to 295 282,40 zł. W ramach Projektu

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 26.04.2017-31.12.2023
			wykonano: 1) docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych, 2) ocieplenie stropodachu wentylowanego, 3) wymianę stolarki okiennej, 4) wymianę drzwi. W ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” przeprowadzono prace remontowe w budynku: - wykonanie podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w celu zapewnienia dostępności budynku, - remont posadzek, - remont ścian i tynków wewnętrznych, malowanie, - dostosowanie i remont łazienek - wykucie nowych otworów drzwiowych wewnętrznych – poprawa funkcjonalności budynku, - szlifowanie i lakierowanie schodów wewnętrznych i balustrady, - roboty elektryczne – wymiana oświetlenia na energooszczędne. Całkowita wartość zadania to 369 928,00 zł, dofinansowanie – 150 000,00 zł. Część prac zakończyła się w 2024 r.
5.	P.4b. Centrum Profilaktyki – wdrożenie programów pomocowych	2019-2022	W ramach funkcjonowania Centrum Profilaktyki do października 2022 roku świadczone było bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne oraz psychoterapii uzależnień.
6.	P.5. Wspieranie integracji mieszkańców obszaru „Przystanek II” poprzez zagospodarowanie terenu dla potrzeb społeczności lokalnej – utworzenie terenu rekreacyjnego	2019-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 26.04.2017-31.12.2023
7.	P.6a. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – kompleksowa modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2021	We wcześniejszym okresie wniosek o dofinansowanie projektu z działania 6.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” zajął 17 miejsce na liście rankingowej po ocenie merytorycznej i znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania (wniosek złożony w 2017 r., wyniki – kwiecień 2018). Wniosek obejmował budynki nr 8, 9, 11, 14, 20 przy ul. POW. W 2022 r. zrealizowano zadanie pn. „Rewitalizacja osiedlowego boiska sportowego na Osiedlu Kozłówka” o wartości 229 853,79 zł z dofinansowaniem w wysokości 136 275 zł z budżetu województwa mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
8.	P.6b. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – działania edukacyjno-aktywizujące	2019-2022	Projekt nie był realizowany we wskazanym okresie.
9.	P.7a. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie	2018-2021	Przygotowana została koncepcja oraz dokumentacja techniczna modernizacji parku w rynku.
10.	P.7b. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie – wsparcie sektora ekonomii społecznej	2019-2021	Projekt nie był realizowany we wskazanym okresie.
11.	P.8. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez	2018-2023	Wniosek o dofinansowanie projektu z działania 6.2

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 26.04.2017-31.12.2023
	renowację budynków komunalnych i zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Narutowicza w Legionowie		Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” zajął 17 miejsce na liście rankingowej po ocenie merytorycznej i znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania. Wniosek obejmował budynek nr 6 przy ul. Narutowicza.
12.	P.9. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w jednostce Bukowiec A – os. komunalne	2018-2023	Zrealizowany został projekt w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 16 075 zł na nasadzenia roślinności m.in. na działkach z terenu projektu rewitalizacyjnego. Całkowita wartość projektu to 32 150 zł.
13.	P.10a. Rewitalizacja budynków mieszkalnych oraz terenu przyległego: chodniki, place zabaw, zieleń przy budynkach 2,3,4 osiedle Jagiellońska	2018-2023	Termomodernizacja budynków nr 2 i 4 przy al. 3 maja zrealizowana została we wcześniejszym okresie.
14.	P.10b. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 8, 26 - osiedle Jagiellońska (IV)	2020-2023	Do końca dobiegała realizacja integracyjnego placu zabaw z dofinansowaniem w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” w wysokości 1 254 600,00 zł. Całkowita wartość projektu to 2 454 213,69 zł.
15.	P.10c. Zagospodarowanie	2018-2019	Projekt został zrealizowany –

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 26.04.2017-31.12.2023
	terenu przy budynkach 33, 34, 35 – osiedle Jagiellońska (IV)		zagospodarowany został plac przy Żłobku Miejskim.
16.	P.10d. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 22, 27, 12, 32 - osiedle Jagiellońska (IV)	2021-2023	W 2022 r. na wskazanym terenie Urząd Miasta wraz z mieszkańcami przeprowadził akcję sadzenia 50 drzew.
17.	P.11. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu okolicy ul. Grudzie i Osiedla Młodych (I)	2019-2023	Zrealizowano projekt pn. „Przebudowa lokalnych węzłów przesiadkowych w Gminie Legionowo (ZADANIE A - dz. ew. 273 obręb 65 (ul. J. Sowińskiego); ZADANIE B - dz. ew. 10/15 oraz 161 obręb 68 (ul. Olszankowa, os. Młodych)” pozyskanych zostało 2,7 mln zł dofinansowania z RPO WM. Część projektu dotyczyła terenu na os. Młodych, który objęty był rewitalizacją. Dodatkowo PWK Legionowo zrealizowało Park Kieszonkowy przy skrzyżowaniu ulic Olszankowej i Suwalnej. Przy ulicy Grudzie zmodernizowany został teren rekreacyjny placu zabaw.
18.	P.12. Poprawa jakości powietrza obszaru rewitalizacji – program wsparcia niskoemisyjnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	2017-2023	W monitorowanym okresie zawarte zostało 293 umowy na dofinansowanie wymiany pieca, w tym 180 umów na obszarze rewitalizacji.
19.	P.13. Rewitalizacja willi Kozłówka	2018-2023	W monitorowanym okresie pozyskane zostało dofinansowanie w ramach RPO WM działanie 5.3 dziedzictwo kulturowe oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego z „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Z powodu cen ofertowych przekraczających możliwości finansowe budżetu gminy odstąpiono od realizacji projektu.

Projekty komplementarne:

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 26.04.2017-31.12.2023
1.	K.1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji	2018-2022	Wymianę opraw na energooszczędne wykonano na obszarze całego miasta. Dotychczas nieenergooszczędne oprawy wymieniono na nowe w ramach projektu dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego z „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Całkowita kwota projektu to 9598329,46 zł, dofinansowanie to 4000000 zł. Projekt „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie Miasta Legionowo” zakończył się w 2024 roku.
2.	K.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Legionowo oraz kompleksowy program profilaktyczny propagujący bezpieczne zachowania osób starszych	2018-2022	Straż miejska prowadziła akcję rozdawania broszur informacyjnych poświęconych bezpieczeństwu osób 60+. Rozdawane były również odbłaski rowerowe zwiększające bezpieczeństwo rowerzystów. Przeprowadzono także spotkania z seniorami na temat pracy straży miejskiej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz spotkania profilaktyczne.
3.	K.3. Antysmogowe ronda i rynek	2017-2023	Projekt nie został zrealizowany. Stowarzyszenie Legionowski Alarm Smogowy, będące realizatorem projektu zostało rozwiązane.
4.	K.5a. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – kompleksowe zagospodarowanie terenu	2018-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.
5.	K.5b. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas –	2019-2023	Projekt nie był realizowany w monitorowanym okresie.

L.p.	Projekt	Harmonogram realizacji LPR	Działania zrealizowane w okresie 26.04.2017-31.12.2023
	wdrożenie programów pomocowych		
6.	K.6. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - Utworzenie Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	2017-2019	Rozbudowa szkoły została zakończona we wcześniejszym okresie.
7.	K.7. Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej	2017-2023	Budowa przyłącza sieci ciepłej dla obiektu Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie przy ul. Jagiellońskiej 69 została zrealizowana we wcześniejszym okresie.
8.	K.8. Poprawa jakości życia i środowiska poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na terenie III Parceli	2017-2020	Projekt zrealizowany w całości we wcześniejszym okresie. Wybudowano: - wodociąg w ul. Żelaznej - wodociąg w ul. Kruczej - wodociąg w ul. Narutowicza
9.	K.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej jednostek: Centrum, III Parcela (II) i Przystanek (II) poprzez remont dróg i chodników	2020-2021	ul. Gawryszewskiego – budowa zakończona, ul. Żelazna, ul. Kujawska, ul. Sienkiewicza, ul. Reymonta – wykonywano remonty cząstkowe, ul. Żelazna – wykonano naprawy emulsja i grysem. Prace trwały także w latach 2022 i 2023.

4. Monitoring rzeczowy

Monitoring rzeczowy – dostarcza danych, które obrazują postęp we wdrażaniu *Programu* oraz umożliwiają ocenę jego wykonania w stosunku do celów ustalonych w *Programie*. Opiera się o skwantyfikowane dane: wskaźniki produktu, rezultatu oraz oddziaływania.

4.1. Wskaźniki produktu i rezultatu dla przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Tabele zawierają dane zsumowane od początku wdrażania LPR.

Projekty podstawowe:

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
1.	P.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla Kozłówka i osiedla Młodych	Liczba zrewitalizowanych obiektów – 0 (wartość założona – 2); Liczba wyposażonych obiektów – bd. (wartość założona – 2); Liczba osób biernych zawodowo niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy objętych wsparciem w programie – bd. (wartość założona – 20); Liczba nowych programów społecznych – bd. (wartość założona – 2); Liczba osób niepełnosprawnych biernych zawodowo niezarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy objętych wsparciem w programie – bd. (wartość założona – 20); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – bd. (wartość założona – 30); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – bd. (wartość założona – 15); Liczba punktów doradczych – bd. (wartość założona – 2).
2.	P.2. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji dzieci, młodzieży i osób	Liczba nowo powstałych miejsc opieki nad dziećmi do 3 r.ż. oraz miejsc w OWP

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
	dorosłych	(p) – 0 (wartość założona – 60); Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu projektów (r) – 474 (wartość założona – 400); Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu projektów (r) – 35 (wartość założona – 50); Liczba placówek oświatowych objętych projektami (p) – 9 (wartość założona – 8); Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w ramach realizacji projektów (p) – 6 szkół i 3 przedszkola (wartość założona – 8); Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia (p) – 0 (wartość założona – 40).
3.	P.3. Wsparcie kompetencji wychowawczych oraz propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców III Parceli	Liczba warsztatów wzmacniających kompetencje wychowawcze rodziców z terenu III Parceli – 0 (wartość założona – 1); Liczba warsztatów propagujących postawy prospołeczne - 0 (wartość założona – 1); Liczba warsztatów kształtujących postawy prospołeczne poprzez kontakt z kulturą - 0 (wartość założona – 1); Liczba imprez szkolnych (pikniki, festyny, zbiórki charytatywne) - 0 (wartość założona – 2); Liczba akcji społecznych podejmowanych przez społeczność lokalną we współpracy ze szkołą i MOKiem - 1 (wartość założona – 1);
4.	P.4a. Centrum Profilaktyki – termomodernizacja i remont	Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 (wartość założona – 1); Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 (wartość założona – 1 2000 m. kw.);
5.	P.4b. Centrum Profilaktyki – wdrożenie programów pomocowych	Liczba osób objętych wsparciem (p) – 2252 ¹ (wartość założona – 40);

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
		Liczba osób niepełnosprawnych objętym wsparciem (p) – bd. (wartość założona – 10); Liczba zrealizowanych programów pomocowych (p) – 12 (wartość założona – 4); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem (p) – bd. (wartość założona – 30);
6.	P.5. Wspieranie integracji mieszkańców obszaru „Przystanek II” poprzez zagospodarowanie terenu dla potrzeb społeczności lokalnej – utworzenie terenu rekreacyjnego	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 0 m. kw. (wartość założona – 5000); Liczba nowych terenów sportowo-rekreacyjnych przeznaczonych na cele społeczne (p) – 0 (wartość założona – 1);
7.	P.6a. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – kompleksowa modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu	Liczba zmodernizowanych budynków mieszkalnych (p) – 0 (wartość założona – 5); Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 360 m. kw. (wartość założona – 10000);
8.	P.6b. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – działania edukacyjno-aktywizujące	Liczba osób objętych działaniami edukacyjno-aktywizującymi – 0 (wartość założona – 100); Liczba wydarzeń kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych – 0 (wartość założona – 2); Liczba wdrożonych programów edukacyjno-aktywizujących – 0 (wartość założona – 2);
9.	P.7a. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) - 0 m2 (wartość założona – 4000); Obiekty publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (p) – 0 (wartość założona – 1);
10.	P.7b. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie – wsparcie sektora ekonomii społecznej	Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie pracujących po opuszczeniu programu (r) – 0 (wartość założona – 2); Liczba osób biernych zawodowo

1 415 w 2018 r., 348 w 2019 r., 582 w 2020 r., 437 w 2021 r. i 470 w 2022 r.

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
		objętych wsparciem w programie (p) - 0 (wartość założona – 20); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po opuszczeniu programu (r) – 0 (wartość założona – 2); Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem (p) – 0 (wartość założona – 1); Liczba stworzonych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (r) – 0 (wartość założona – 2); Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (p) – 0 (wartość założona – 20);
11.	P.8. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację budynków komunalnych i zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Narutowicza w Legionowie	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 0 (wartość założona – 1500 m. kw.); Liczba obiektów mieszkalnych poddanych rewitalizacji (p) – 0 (wartość założona – 2); Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (p) – 0 (wartość założona – 2);
12.	P.9. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w jednostce Bukowiec A – os. komunalne	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 90 m. kw. (wartość założona – 5000); Liczba osób deklarujących wpływ projektu na wzmocnienie więzi społecznych i poprawę jakości życia (r) – bd. (wartość założona – 50);
13.	P.10a. Rewitalizacja budynków mieszkalnych oraz terenu przyległego: chodniki, place zabaw, zieleń przy budynkach 2,3,4 osiedle Jagiellońska	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – 2150 m. kw. (wartość założona – 5000 m. kw.); Liczba obiektów mieszkalnych poddanych rewitalizacji (p) – 2 (wartość założona – 2); Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (p) – 2 (wartość założona – 2).
14.	P.10b. Zagospodarowanie terenu przy	Powierzchnia zrewitalizowanej

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
	budynkach 8, 26 - osiedle Jagiellońska (IV)	przestrzeni publicznej – 6804,82 m. kw. (wartość założona – 5000 m. kw.);
15..	P.10c. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 33, 34, 35 – osiedle Jagiellońska (IV)	Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej (p) – 3000 m. kw. (wartość założona – 8000 m. kw.)
16.	P.10d. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 22, 27, 12, 32 - osiedle Jagiellońska (IV)	Powierzchnia zrewitalizowanej przestrzeni publicznej – 2500 m. kw (wartość założona – 6000 m. kw.);
17.	P.11. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu okolicy ul. Grudzie i Osiedla Młodych (I)	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 3250 m. kw. (wartość założona – 5000 m. kw.); Liczba osób deklarujących wpływ projektu na wzmocnienie więzi społecznych i poprawę jakości życia – bd. (wartość założona – 60).
18.	P.12. Poprawa jakości powietrza obszaru rewitalizacji – program wsparcia niskoemisyjnych źródeł energii w gospodarstwach domowych	Zmniejszenie liczby palenisk węglowych (p) - 180 ² (wartość założona – 400); Liczba przeprowadzonych kampanii społecznych (p) – 10 (wartość założona – 2); Liczba przyłączonych nowych pieców (p) – 180 (wartość założona – 400); Liczba osób objętych wsparciem (p) – 180 (wartość założona – 100) – podana liczba gospodarstw domowych; Liczba wydanych i dystrybuowanych materiałów informacyjnych (p) – 16 000 (wartość założona – 500); Liczba szkoleń (p) – 73 ³ (wartość założona – 2); Liczba spotkań z mieszkańcami (p) – 0 (wartość założona – 2); Szacowany łączny roczny spadek emisji gazów cieplarnianych po zakończeniu projektu (r) – 1004,4 Mg/rok ⁴ (wartość założona – 350)
19.	P.13. Rewitalizacja willi Kozłówka	Liczba zmodernizowanych budynków – 0 (wartość założona – 1); Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0 (wartość założona – 14 221 m. kw);

2 Liczone od momentu uchwalenia LPR.

3 Liczone jako liczba szkoleń przeprowadzonych w szkołach.

4 Według stanu na 31.12.2019 r. Wartość obliczona została na podst. danych z PGN. Przyjęte obniżenie emisji gazów cieplarnianych dla jednego domu (o pow. 120 m²) wynosi 5,58 Mg CO₂/rok.

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
1.	K.1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji	Liczba zmodernizowanych punktów świetlnych (p) – 776 (wartość założona – 776)
2.	K.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Legionowo oraz kompleksowy program profilaktyczny propagujący bezpieczne zachowania osób starszych	Liczba kamer (p) – 49 (liczba kamer w całym Legionowie) (wartość założona – 41); Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-promocyjnych (p) – 30 (wartość założona – 2); Liczba ulotek wydanych mieszkańcom (p) – bd. (wartość założona – 500); Liczba zorganizowanych spotkań (p) – 67 (wartość założona – 2);
3.	K.3. Antysmogowe ronda i rynek	Liczba nowo utworzonych obiektów infrastruktury (p) – 0 (wartość założona – 4);
4.	K.5a. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – kompleksowe zagospodarowanie terenu	Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją (p) – bd. (wartość założona – 500 m. kw.);
5.	K.5b. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – wdrożenie programów pomocowych	Liczba wdrożonych programów (p) – bd. (wartość założona – 2); Liczba osób objętych wsparciem (p) – bd. (wartość założona – 20);
6.	K.6. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie - Utworzenie Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu	Liczba rozbudowanych obiektów (p) – 1 (wartość założona – 1); Liczba nowo powstałych miejsc opieki przedszkolnej (r) – bd. (wartość założona – 30); Liczba dzieci objętych wsparciem przez Centrum Wczesnego Wspomagania (p) – bd. (wartość założona – 30); Liczba osób objętych wsparciem przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (p) – bd. (wartość założona – 30); Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (p) – 1 (wartość założona – 1); Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – bd. (wartość założona – 4500 m. kw.); Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 1 (wartość założona – 1);
7.	K.7. Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej	Dostawa i montaż węzła cieplnego (p) - 1 szt (wartość założona – 1); Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej (p) – 166,15 mb (wartość założona – 2800);
8.	K.8. Poprawa jakości życia i środowiska	Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych (p)

L.p.	Projekt	Osiągnięte wskaźniki
	poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na terenie III Parceli	– 1 (wartość założona – 1); Długość sieci wodociągowej (p) - 1912 mb. (wartość założona – 1900);
9.	K.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej jednostek: Centrum, III Parcela (II) i Przystanek (II) poprzez remont dróg i chodników	Długość zmodernizowanych dróg (p) – 444 m (wartość założona – 1900 m); Liczba nowych elementów bezpieczeństwa ruchu (p) – 3 (wartość założona – 10); Liczba nowych energooszczędnych punktów świetlnych (r) – 9 (wartość założona – 12); Wszystkie punkty świetlne na drogach publicznych gminnych zostały wymienione w ramach zadania opisanego przy projekcie K1.

4.2. Wskaźniki obszaru rewitalizacji

L.p.	Wskaźniki oddziaływania na obszarze rewitalizacji	Wartość bazowa (dane za rok 2015)	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – osiągnięta	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2021) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2021) – osiągnięta	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2023) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2023) – osiągnięta
1.	Liczba osób bezrobotnych	645	642	342	639	389	626	328
2.	Liczba osób korzystających z pomocy społecznej	645	642	490	639	530	632	452
3.	Liczba osób żyjących poniżej granicy ubóstwa	225	224	232	223	274	223	271
4.	Liczba czytelników biblioteki	1470	1485	1716	1514	2345	1573	2109
5.	Liczba rodzin z niebieską kartą	28	28	46	28	38	27	48
6.	Liczba nowo powstałych organizacji pozarządowych	0	1	1 ⁵	2	4 ⁶	5	7 ⁷
7.	Obiekty infrastruktury społecznej	26	26	26 ⁸	27	26	28	28

5 Fundacja Per Capita KRS 0000721722;

6 Fundacja Per Capita KRS 0000721722, stow. zw.: Jagiellońska 9D; Fortis; Zdrowym BYĆ;

7 Fundacja Per Capita KRS 0000721722, stow. zw.: Jagiellońska 9D; Fortis; Zdrowym BYĆ, Stowarzyszenie "Koci Zakątek, „Stowarzyszenie Rodu Popek”, Stowarzyszenie VW Classic Mazowsze;

8 Liczone zgodnie z metodą opisaną w LPR.

L.p.	Wskaźniki oddziaływania na obszarze rewitalizacji	Wartość bazowa (dane za rok 2015)	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – osiągnięta	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2021) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2021) – osiągnięta	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2023) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2023) – osiągnięta
8.	Liczba eksmisji za 2 ostatnie lata	25	25	24	24	1	22	20
9.	Liczba bezrobotnych długotrwale	366	365	159	363	251	356	201
10.	Liczba bezrobotnych z wykształceniem poniżej średniego	383	382	213	380	243	372	177
11.	Liczba nowo powstałych jednoosobowych działalności gospodarczych	0	3	237 ⁹	7	139 ¹⁰	15	127 ¹¹
12.	Liczba podmiotów gospodarczych	1216	1222	1122 ¹²	1228	1057 ¹³	1240	1144 ¹⁴
13.	Liczba zagospodarowanych terenów przeznaczonych na cele społeczne (plac zabaw, tereny dla seniorów i niepełnosprawnych, tereny rekreacyjne, rynek, boiska, park linowy, urządzone tereny zieleni)	0	2	1	3	2	6	5
14.	Liczba zrewitalizowanych	0	2	2	3	2	11	3

9 Liczba nowo powstałych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG od dnia 27.04.2017 r., które pozostają aktywne na dzień 29.01.2020 r.

10 Liczba nowo powstałych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG od dnia 29.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. r., które pozostają aktywne według raportu z maja 2022 r.

11 Liczba nowo powstałych działalności gospodarczych wpisanych do CEIDG od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2023 r. r., które pozostają aktywne według raportu z września 2024 r..

12 Stan na 29.01.2020 r.

13 Stan na 31.12.2021 r.

14 Stan według bazy CEIDG na 31.12.2023 r. według raportu z września 2024 r.

L.p.	Wskaźniki oddziaływania na obszarze rewitalizacji	Wartość bazowa (dane za rok 2015)	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2019) – osiągnięta	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2021) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2021) – osiągnięta	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2023) – zakładana	Wartość w toku wdrażania procesu rewitalizacji (2023) – osiągnięta
	ch budynków							

Spadek wskaźnika nr 12 może świadczyć o małej trwałości działalności gospodarczych prowadzonych na obszarze rewitalizacji. Wysoki wskaźnik niebieskich kart w stosunku do zakładanego, świadczący o zwiększonym poziomie przemocy w rodzinach, powoduje konieczność podjęcia wzmożonych działań w tej sferze.

5. Monitoring finansowy

Monitoring finansowy – dostarcza danych będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania środków przeznaczonych na Lokalny Program Rewitalizacji. Monitoring finansowy polega na systematycznym porównywaniu poniesionych wydatków do przewidzianego budżetu.

Projekty podstawowe:

L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2023 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
1.	P.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców osiedla Kozłówka i osiedla Młodych	1 000 000 zł	538 481,08 ¹⁵ zł	54%
2.	P.2. Wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych	3 000 000 zł	930 574,20 ¹⁶	31%
3.	P.3. Wspieranie kompetencji wychowawczych oraz propagowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców III Parceli	150 000 zł	34 096,83 zł	22,7%
4.	P.4a. Centrum Profilaktyki – termomodernizacja i remont	300 000 zł	665 210,40 zł	222%
5.	P.4b. Centrum Profilaktyki – wdrożenie programów pomocowych	100 000 zł	547 948,38 zł ¹⁷	548%
6.	P.5. Wspieranie integracji mieszkańców obszaru „Przystanek II” poprzez zagospodarowanie terenu dla potrzeb społeczności lokalnej – utworzenie terenu rekreacyjnego	750 000 zł	0 zł	0
7.	P.6a. Rewitalizacja Osiedla Kozłówka – kompleksowa modernizacja budynków wraz z zagospodarowaniem terenu	2 500 000 zł	229 853,79 zł ¹⁸	0
8.	P.6b. Rewitalizacja Osiedla	500 000 zł	0 zł	0

15 Projekt „Silna rodzina...” 2018 – 116 801,58, 2019 – 271 213,44; Projekt „Aktywność to droga...” 2018 – 150 466,06;

16 Wykonanie wydatków projektu „Edukacja zawodowa w szkołach trampoliną...” za 2017 i 2018 r., wykonanie „Aktywna tablica” za 2021 r. oraz wykonanie projektu „Dobry start każdego przedszkolaka”

17 166 073,38 zł w 2018 r., 85 000 zł w 2019 r., 100 000 zł w 2020 r. i 105 000 zł w 2021 r., 91 875 zł w 2022 r.

18 Podano koszt rewitalizacji boiska. Koszty dotyczące budynków podane zbiorczo przy projekcie P.8.

L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2023 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
	Kozłówka – działania edukacyjno-aktywizujące			
9.	P.7a. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie	1 200 000 zł	47 847 zł	4%
10.	P.7b. Rewitalizacja Rynku Miejskiego w Legionowie – wsparcie sektora ekonomii społecznej	800 000 zł	0 zł	0
11.	P.8. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez renowację budynków komunalnych i zagospodarowanie terenu przy ul. Bałtyckiej i Narutowicza w Legionowie	980 000 zł	37 330 zł ¹⁹	3,8%
12.	P.9. Kompleksowa odnowa przestrzeni publicznej w jednostce Bukowiec A – os. komunalne	300 000 zł	32 150,00 zł	10,7%
13.	P.10a. Rewitalizacja budynków mieszkalnych oraz terenu przyległego: chodniki, place zabaw, zieleń przy budynkach 2,3,4 osiedle Jagiellońska	1 650 000 zł	1 809 250,55 zł	110% projekt zrealizowany
14.	P.10b. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 8, 26 - osiedle Jagiellońska (IV)	150 000 zł	2 484 596,29 zł	1656% projekt zrealizowany, ukończony na początku 2022 r.
15.	P.10c. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 33, 34, 35 – osiedle Jagiellońska (IV)	300 000 zł	523 689,98 zł	175% projekt zrealizowany
16.	P.10d. Zagospodarowanie terenu przy budynkach 22, 27, 12, 32 - osiedle Jagiellońska (IV)	200 000 zł	9800 zł	4,9%
17.	P.11. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu okolicy ul. Grudzie i Osiedla Młodych (I)	140 000 zł	2 797 518,84 ²⁰	1 998%
18.	P.12. Poprawa jakości powietrza obszaru rewitalizacji – program	3 000 000 zł	1 864 563,09 zł	38%

19 Wydatki obejmują nakłady na dokumentację techniczną budynków Narutowicza 6 oraz budynków z projektu podstawowego nr 6a (poniesione przez Urząd Miasta i KZB Legionowo Sp. z o.o.).

20 2 454 075,49 zł – koszt modernizacji węzła przesiadkowego na os. Młodych, 343 443,35 – koszt placu zabaw przy ul. Grudzie.

L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2023 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
	wsparcia niskoemisyjnych źródeł energii w gospodarstwach domowych			
19.	P.13. Rewitalizacja willi Kozłówka	3 000 000 zł	46 779,00 zł	1,5%
	Łącznie	19 670 000 zł	12 599 689,43 zł	64,06%

L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2023 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
1.	K.1. Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę opraw oświetleniowych w ciągach komunikacyjnych na obszarze rewitalizacji	1 000 000 zł	9 786 074,50 zł ²¹	978%
2.	K.2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez modernizację istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Legionowo oraz kompleksowy program profilaktyczny propagujący bezpieczne zachowania osób starszych	200 000 zł	0 zł ²²	0%
3.	K.3. Antysmogowe ronda i rynek	349 000 zł	0 zł	0%
4.	K.5a. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – kompleksowe zagospodarowanie terenu	90 000 zł	0 zł	0%
5.	K.5b. Rozwój usług społecznych na rzecz podopiecznych legionowskiego Caritas – wdrożenie programów pomocowych	60 000 zł	0 zł	0%
6.	K.6. Rozbudowa Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek	4 700 000 zł	7 097 424,92 zł	151%

21 W tym uwzględniono całkowite koszty projektu wymiany opraw oświetlenia ulicznego w całym mieście, ze względu na brak danych finansowych odnoszących się bezpośrednio do obszaru rewitalizacji.

22 Realizacja projektu prowadzona była w ramach kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej.


L.p.	Projekt	Przewidywany budżet w LPR	Wydatki poniesione od początku realizacji do końca 2023 r.	Zrealizowany % założonej kwoty
	Specjalnych w Legionowie - Utworzenie Centrum Poradnictwa i Wczesnego Wspomagania rozwoju dziecka wraz z zagospodarowaniem terenu			
7.	K.7. Poprawa stanu środowiska poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej	13 625 000 zł	431 995 zł	3%
8.	K.8. Poprawa jakości życia i środowiska poprzez rozbudowę sieci wodociągowej na terenie III Parceli	1 170 000 zł	482 640,43 zł	41% projekt zrealizowany oszczędność względem planu: 687 359,57 zł
9.	K.4. Poprawa dostępności komunikacyjnej jednostek: Centrum, III Parcela (II) i Przystanek (II) poprzez remont dróg i chodników	3 570 000 zł	965 371,89 zł	27%
	Łącznie	24 764 000 zł	18 763 506,74zł	75,77%

6. Monitoring ryzyk

Monitoring ryzyk – polega na obserwacji zmienności uwarunkowań zewnętrznych, identyfikacji potencjalnych trudności w realizacji *Lokalnego Programu Rewitalizacji*, a także racjonalnym reagowaniu na zaistniałe zmiany.

6.1 Postępujące „starzenie się” społeczeństwa

Legionowska społeczność dotknięta jest problemem szybko postępującego „starzenia się”. Tempo wzrostu udziału osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców jest wyższe niż w innych podobnych miastach Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Udział osób w wieku poprodukcyjnym wzrósł z ponad 10% w 1995 roku do niemal 25% w 2023 roku (ilustracja 1). Postępujący proces „starzenia się” wymagać będzie odpowiedniego dostosowania polityki prowadzonej przez władze miasta, również w ramach procesu rewitalizacji. W kolejnym programie rewitalizacji intensyfikacji powinny podlegać działania na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnościami i osób przewlekle chorych.

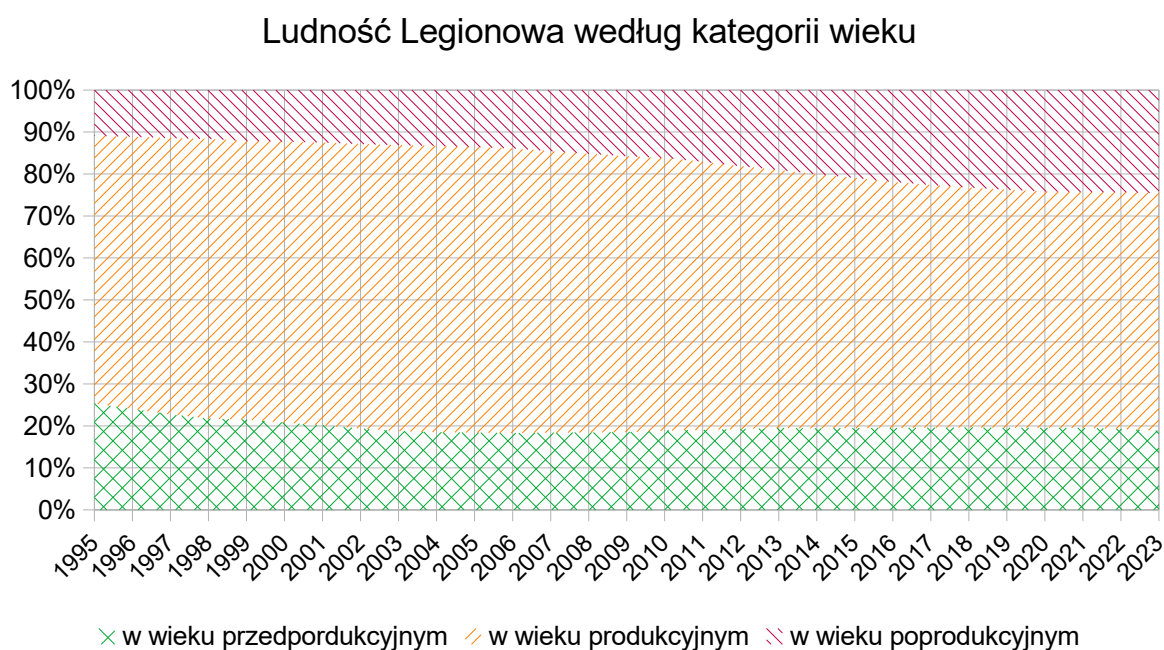

Ilustracja 1: Ludność Legionowa według kategorii wieku. Opracowanie własne na podst. BDL GUS.

6.2 Dostępność środków z UE

Działania rewitalizacyjne w znaczącej większości finansowane są ze środków zewnętrznych (w szczególności pochodzących z Unii Europejskiej). W okresie 2022-2023 oczekiwano na uruchomienie środków finansowych z perspektywy 2021-2027 oraz z Krajowego Planu Odbudowy, co nie pozwalało na dokładne planowanie dalszych działań rewitalizacyjnych ze współfinansowaniem zewnętrznym.

Możliwość korzystania z funduszy unijnych m.in. z perspektywy 2021-2027 będzie możliwa jedynie po opracowaniu, uchwaleniu i zaakceptowaniu gminnego programu rewitalizacji zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o rewitalizacji. Proces opisany we ww. ustawie będzie kilkietapowy i szacunkowo jego realizacja może potrwać od 12 do 18 miesięcy.

Urząd Miasta Legionowo opracował diagnozę służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w sierpniu 2024 roku.

7. Ocena końcowa

Wskazane w powyższych rozdziałach dane nt. realizacji projektów zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Miejskiej Legionowo do roku 2023 pozwalają na ocenę dotychczasowego postępu procesu rewitalizacji.

W monitorowanym okresie – od początku wdrażania programu do końca 2023 roku zrealizowane w całości zostały 7 z 19 projektów podstawowych oraz 3 z 9 projektów komplementarnych. Częściowo zrealizowano 6 z 19 projektów podstawowych oraz 3 z 9 projektów komplementarnych.

Finansowa ogólna realizacja programu wynosi 64,06% dla projektów podstawowych i 75,77% dla projektów komplementarnych (poniesione nakłady w stosunku do planowanych).

Na koniec 2023 roku zakładane poziomy wskaźników ogólnych monitoringu w większości zostały osiągnięte – 9/14 wskaźników.

Przedstawione w sprawozdaniu dane pozwalają na ocenienie realizacji procesu rewitalizacji jako zadowalającej.

Opracował:

data i podpis

Zatwierdziła:

data i podpis

Zapisy Raportu akceptuję:

data i podpis
